


ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н „Овча купел“ за м. „Овча купел – стар“

ID	Наименование	Начало	Край	Продължителност
1	Обект: Избор за изпълнител за извършване на СМР на строеж за реализация на подобект: „Работен проект за ВиК мрежа на кв. „Овча купел – стара част“ подетап IА	Mon 3/18/19	Tue 4/16/19	30 days
2	Участък по ул. „Ангелов връх“	Mon 3/18/19	Mon 4/1/19	15 days
3	Канализационен Клон 1 - ул. Ангелов връх (РШБ-същ. - РШЗ)	Mon 3/18/19	Mon 4/1/19	15 days
4	Разваляне на настилки и изкопни работи	Mon 3/18/19	Sun 3/24/19	7 days
5	СМР по част ВиК	Thu 3/21/19	Thu 3/28/19	8 days
6	Насипни работи и възстановяване на настилки	Fri 3/29/19	Mon 4/1/19	4 days
7	Водопровод - Клон 2 - ул. Ангелов връх	Sat 3/23/19	Mon 4/1/19	10 days
8	Разваляне на настилки и изкопни работи	Sat 3/23/19	Wed 3/27/19	5 days
9	СМР по част ВиК	Mon 3/25/19	Sat 3/30/19	6 days
10	Насипни работи и възстановяване на настилки	Sun 3/31/19	Mon 4/1/19	2 days
11	Участък по ул. „Паскал Тодоров“	Tue 4/2/19	Tue 4/16/19	15 days
12	Канализационен Клон 1 - ул. Паскал Тодоров (РШЗ-РШ1)	Tue 4/2/19	Tue 4/16/19	15 days
13	Разваляне на настилки и изкопни работи	Tue 4/2/19	Mon 4/8/19	7 days
14	СМР по част ВиК	Fri 4/5/19	Fri 4/12/19	8 days
15	Насипни работи и възстановяване на настилки	Sat 4/13/19	Tue 4/16/19	4 days
16	Водопровод - Клон 1 т.61-т.62 - ул. Паскал Тодоров	Sun 4/7/19	Tue 4/16/19	10 days
17	Разваляне на настилки и изкопни работи	Sun 4/7/19	Thu 4/11/19	5 days
18	СМР по част ВиК	Tue 4/9/19	Sun 4/14/19	6 days
19	Насипни работи и възстановяване на настилки	Mon 4/15/19	Tue 4/16/19	2 days
20	Участък по ул. Долно село и ул. Ангелов връх	Mon 3/18/19	Thu 4/4/19	18 days
21	Канализационен Клон 4 - ул. Долно село (РШ12-РШ10) + ул. Ангелов връх (РШ10-РШ9)	Mon 3/18/19	Thu 4/4/19	18 days
22	Разваляне на настилки и изкопни работи	Mon 3/18/19	Mon 3/25/19	8 days
23	СМР по част ВиК	Thu 3/21/19	Sat 3/30/19	10 days
24	Насипни работи и възстановяване на настилки	Sun 3/31/19	Thu 4/4/19	5 days
25	Водопровод - Клон 14b - ул. Долно село + Клон 14a от т.65 до т.64 - ул. Ангелов връх	Sat 3/23/19	Thu 4/4/19	13 days
26	Разваляне на настилки и изкопни работи	Sat 3/23/19	Thu 3/28/19	6 days
27	СМР по част ВиК	Mon 3/25/19	Mon 4/1/19	8 days
28	Насипни работи и възстановяване на настилки	Tue 4/2/19	Thu 4/4/19	3 days

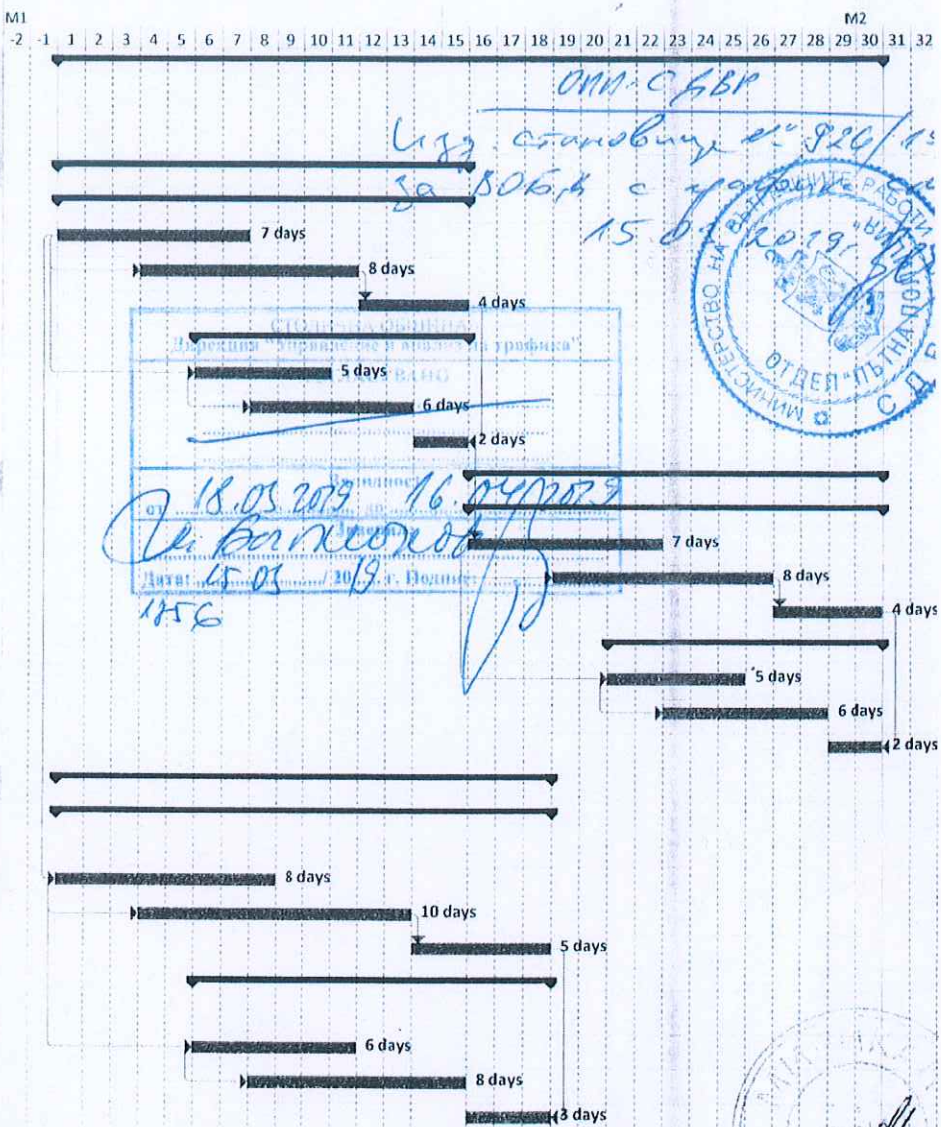

Възложител: *Христова*
 14-03-2019
